Investitor: MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Objekt: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIRČE, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

TERMINSKI PLAN NAPREDOVANJA DEL - TP1

Sofinancira Evropska unija

ID	Naloga / Faza	Trajanje	Začetek	Konec	Predecessors
1	IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIRČE	820 d	Tue 3.02.26	Wed 3.05.28	
2	PRIPRAVLJALNA, ZEMELJSKA, GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA	820 d	Tue 3.02.26	Wed 3.05.28	
3	UVEDBA V DELO	820 d	Tue 3.02.26	Wed 3.05.28	
4	Pripravljalna dela (zakoličba, naročanje, zavarovanje in ureditev gradbišča)	820 d	Tue 3.02.26	Wed 3.05.28	
5	Postavitev cestne zapore in zakoličba obstoječih komunalnih vodov	745 d	Fri 17.04.26	Mon 1.05.28	4SS+73 d
6	FEKALNA KANALIZACIJA	711 d	Mon 20.04.26	Fri 31.03.28	
7	KANAL F1	167 d	Mon 8.03.27	Sun 22.08.27	41FS+2 d
8	KANAL F2	52 d	Thu 27.05.27	Sun 18.07.27	7SS+80 d
9	KANAL F3	63 d	Mon 19.07.27	Mon 20.09.27	8FS+1 d
10	KANAL F3.1	23 d	Tue 21.09.27	Thu 14.10.27	9FS+1 d
11	KANAL F3.2	20 d	Fri 15.10.27	Thu 4.11.27	10FS+1 d
12	KANAL F3.3	20 d	Fri 5.11.27	Thu 25.11.27	11FS+1 d
13	KANAL F4	64 d	Fri 26.11.27	Sat 29.01.28	12FS+1 d
14	KANAL F4.1	24 d	Sun 30.01.28	Wed 23.02.28	13FS+1 d
15	KANAL F4.2	17 d	Thu 24.02.28	Sun 12.03.28	14FS+1 d
16	KANAL F4.3	18 d	Mon 13.03.28	Fri 31.03.28	15FS+1 d
17	KANAL F5	30 d	Fri 10.12.27	Sun 9.01.28	25FS+1 d
18	KANAL F6	39 d	Mon 10.01.28	Fri 18.02.28	17FS+1 d
19	KANAL F6.1	20 d	Sat 19.02.28	Fri 10.03.28	18FS+1 d
20	KANAL F6.2	20 d	Sat 11.03.28	Fri 31.03.28	19FS+1 d
21	KANAL F7	54 d	Wed 30.06.27	Mon 23.08.27	28FS+1 d
22	KANAL F8	55 d	Tue 24.08.27	Mon 18.10.27	21FS+1 d
23	KANAL F8.1	9 d	Tue 19.10.27	Thu 28.10.27	22FS+1 d
24	KANAL F9	16 d	Fri 29.10.27	Sun 14.11.27	23FS+1 d
25	KANAL F9.1	24 d	Mon 15.11.27	Thu 9.12.27	24FS+1 d
26	KANAL F10	47 d	Sat 10.04.27	Thu 27.05.27	32FS+1 d
27	KANAL F10.1	18 d	Fri 28.05.27	Tue 15.06.27	26FS+1 d
28	KANAL F10.2	13 d	Wed 16.06.27	Tue 29.06.27	27FS+1 d
29	KANAL F11	86 d	Sat 8.08.26	Mon 2.11.26	34SS+35 d
30	KANAL F12	35 d	Sun 14.02.27	Sun 21.03.27	49FS+1 d
31	KANAL F12.1	8 d	Mon 22.03.27	Tue 30.03.27	30FS+1 d
32	KANAL F12.2	9 d	Wed 31.03.27	Fri 9.04.27	31FS+1 d
33	KANAL F13	260 d	Mon 20.04.26	Tue 5.01.27	5SS+3 d
34	KANAL F13.2	10 d	Sat 4.07.26	Tue 14.07.26	33SS+75 d
35	KANAL F14	39 d	Wed 15.07.26	Sun 23.08.26	34FS+1 d
36	KANAL F14.1	40 d	Mon 24.08.26	Sat 3.10.26	35FS+1 d
37	KANAL F14.2	13 d	Sun 4.10.26	Sat 17.10.26	36FS+1 d
38	KANAL F15	55 d	Thu 26.11.26	Wed 20.01.27	50FS+1 d
39	KANAL F16	19 d	Thu 21.01.27	Tue 9.02.27	38FS+1 d
40	KANAL F16.1	20 d	Wed 10.02.27	Tue 2.03.27	39FS+1 d
41	KANAL F16.1.1	3 d	Wed 3.03.27	Sat 6.03.27	40FS+1 d
42	KANAL F17	7 d	Sun 18.10.26	Sun 25.10.26	37FS+1 d
43	KANAL F18	8 d	Mon 26.10.26	Tue 3.11.26	42FS+1 d
44	KANAL F19	10 d	Wed 4.11.26	Sat 14.11.26	43FS+1 d
45	KANAL F20	12 d	Sun 15.11.26	Fri 27.11.26	44FS+1 d
46	KANAL F21	10 d	Sat 28.11.26	Tue 8.12.26	45FS+1 d
47	KANAL F22	51 d	Wed 9.12.26	Fri 29.01.27	46FS+1 d
48	KANAL F22.1	6 d	Sat 30.01.27	Fri 5.02.27	47FS+1 d
49	KANAL F22.2	7 d	Sat 6.02.27	Sat 13.02.27	48FS+1 d
50	KANAL F23	7 d	Wed 18.11.26	Wed 25.11.26	51FS+1 d
51	KANAL F24	14 d	Tue 3.11.26	Tue 17.11.26	29FS+1 d
52	TLAČNI VOD IN ČRPALIŠČE	79 d	Sat 8.08.26	Mon 26.10.26	29SS
53	OBNOVA VODOVODA	681 d	Wed 20.05.26	Fri 31.03.28	
54	VODOVOD 1	107 d	Fri 7.05.27	Sun 22.08.27	7SS+60 d
55	VODOVOD 2	52 d	Thu 27.05.27	Sun 18.07.27	8SS
56	VODOVOD 2.1	38 d	Thu 10.06.27	Sun 18.07.27	55SS+14 d
57	VODOVOD 2.2	24 d	Thu 24.06.27	Sun 18.07.27	56SS+14 d
58	VODOVOD 3, 3.1, 3.2, 3.3	129 d	Mon 19.07.27	Thu 25.11.27	9SS
59	VODOVOD 4, 4.1, 4.2	126 d	Fri 26.11.27	Fri 31.03.28	13SS
60	VODOVOD 5	30 d	Fri 10.12.27	Sun 9.01.28	17SS
61	VODOVOD 6, 6.1, 6.2	81 d	Mon 10.01.28	Fri 31.03.28	18SS
62	VODOVOD 7, 7.1	87 d	Wed 30.06.27	Sat 25.09.27	21SS
63	VODOVOD 8	65 d	Tue 24.08.27	Thu 28.10.27	22SS
64	VODOVOD 9, 9.1, 9.2, 9.3	160 d	Thu 21.01.27	Wed 30.06.27	39SS
65	VODOVOD 10, 10.1, 10.2	80 d	Sat 10.04.27	Tue 29.06.27	26SS
66	VODOVOD 11	18 d	Fri 28.05.27	Tue 15.06.27	27SS
67	VODOVOD 12, 12.1, 12.2	54 d	Sun 14.02.27	Fri 9.04.27	30SS
68	VODOVOD 13, 13.1, 13.2, 13.3	185 d	Sat 4.07.26	Tue 5.01.27	34SS
69	VODOVOD 14, 14.1, 14.2, 14.3	94 d	Wed 15.07.26	Sat 17.10.26	35SS
70	VODOVOD 15	55 d	Thu 26.11.26	Wed 20.01.27	38SS
71	VODOVOD 17	16 d	Sun 18.10.26	Tue 3.11.26	42SS
72	VODOVOD 19	10 d	Wed 4.11.26	Sat 14.11.26	44SS
73	VODOVOD 20	12 d	Sun 15.11.26	Fri 27.11.26	45SS
74	VODOVOD 21	10 d	Sat 28.11.26	Tue 8.12.26	46SS
75	VODOVOD 22, 22.1, 22.2	58 d	Wed 9.12.26	Fri 5.02.27	47SS
76	VODOVOD 24	86 d	Sat 8.08.26	Mon 2.11.26	29SS
77	VODOVOD 25.1, 25.2	50 d	Wed 20.05.26	Thu 9.07.26	33SS+30 d
78	VODOVOD MAGISTRALNI	155 d	Mon 3.08.26	Tue 5.01.27	68SS+30 d
79	METEORNA KANALIZACIJA	681 d	Wed 20.05.26	Fri 31.03.28	

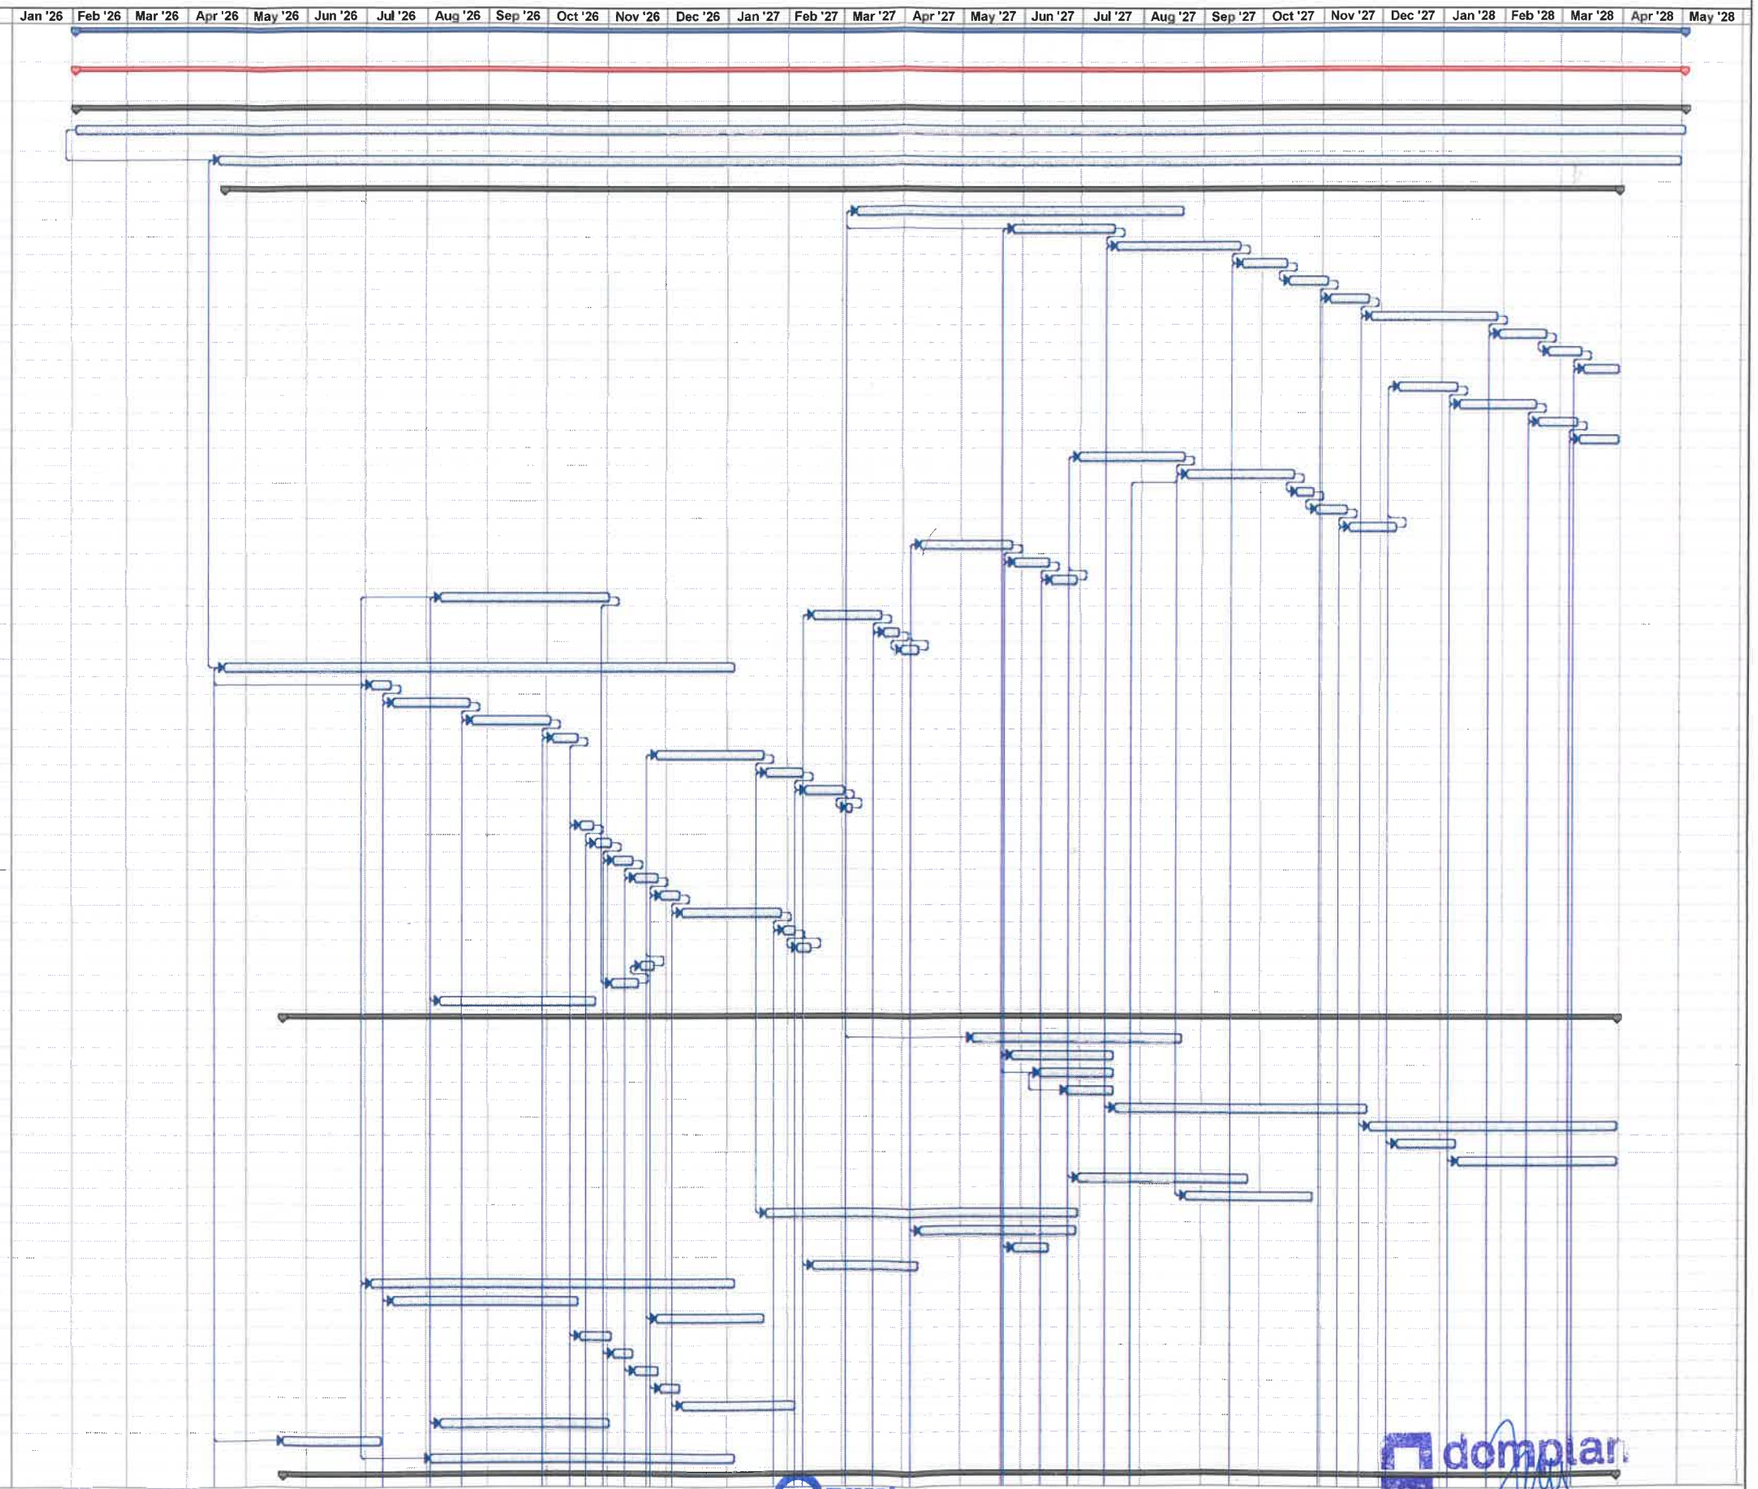

Ljubljana, 09.02.2026

RIKO, celovite tehnološke rešitve, d. o. o.
Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

16

PIRC gradnje d.o.o.
LJUBLJANA

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., RIKO d.o.o., PIRC gradnje d.o.o. Ljubljana
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.

Domplan d.d. Kranj
Plejerjeva cesta 14
Vodja dej. Alan Slavinec

8

Investitor: MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Objekt: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIRČE, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

TERMINSKI PLAN NAPREDOVANJA DEL - TP1

Sofinancira Evropska unija

ID	Naloga / Faza	Trajanje	Začetek	Konec	Predecessors
80	KANAL M1	51 d	Mon 8.03.27	Wed 28.04.27	7SS
81	KANAL M10	47 d	Sat 10.04.27	Thu 27.05.27	26SS
82	KANAL M10.1	18 d	Fri 28.05.27	Tue 15.06.27	27SS
83	KANAL M10.2	13 d	Wed 16.06.27	Tue 29.06.27	28SS
84	KANAL M11	133 d	Sat 8.08.26	Sat 19.12.26	29SS
85	KANAL M12	35 d	Sun 14.02.27	Sun 21.03.27	30SS
86	KANAL M12.1	8 d	Mon 22.03.27	Tue 30.03.27	31SS
87	KANAL M13	39 d	Sun 7.06.26	Thu 16.07.26	90FS+1 d
88	KANAL M13.1	7 d	Mon 27.07.26	Mon 3.08.26	89FS+1 d
89	KANAL M13.2	9 d	Fri 17.07.26	Sun 26.07.26	87FS+1 d
90	KANAL M13.3	17 d	Wed 20.05.26	Sat 6.06.26	33SS+30 d
91	KANAL M14	39 d	Wed 15.07.26	Sun 23.08.26	35SS
92	KANAL M14.1	40 d	Mon 24.08.26	Sat 3.10.26	36SS
93	KANAL M14.2	13 d	Sun 4.10.26	Sat 17.10.26	37SS
94	KANAL M14.3	10 d	Sun 13.09.26	Wed 23.09.26	92SS+20 d
95	KANAL M15	38 d	Thu 26.11.26	Sun 3.01.27	38SS
96	KANAL M16	106 d	Mon 4.01.27	Tue 20.04.27	95FS+1 d
97	KANAL M16.1	16 d	Wed 10.02.27	Fri 26.02.27	40SS
98	KANAL M17	24 d	Mon 15.11.27	Thu 9.12.27	25SS
99	KANAL M18	8 d	Mon 26.10.26	Tue 3.11.26	43SS
100	KANAL M18.1	7 d	Sun 18.10.26	Sun 25.10.26	42SS
101	KANAL M19	10 d	Wed 4.11.26	Sat 14.11.26	44SS
102	KANAL M2	59 d	Tue 21.09.27	Fri 19.11.27	10SS
103	KANAL M2.1	16 d	Fri 5.11.27	Sun 21.11.27	12SS
104	KANAL M2.2	13 d	Sat 26.06.27	Fri 9.07.27	8SS+30 d
105	KANAL M2.3	10 d	Sat 10.07.27	Tue 20.07.27	104FS+1 d
106	KANAL M20	12 d	Sun 15.11.26	Fri 27.11.26	45SS
107	KANAL M21	10 d	Sat 28.11.26	Tue 8.12.26	46SS
108	KANAL M22	51 d	Wed 9.12.26	Fri 29.01.27	47SS
109	KANAL M22.1	4 d	Sat 30.01.27	Wed 3.02.27	48SS
110	KANAL M3	11 d	Sun 6.06.27	Thu 17.06.27	8SS+10 d
111	KANAL M3.3	44 d	Tue 20.07.27	Thu 2.09.27	9SS+1 d
112	KANAL M30	154 d	Tue 4.08.26	Tue 5.01.27	88FS+1 d
113	KANAL M4	34 d	Fri 3.09.27	Thu 7.10.27	111FS+1 d
114	KANAL M4.1	43 d	Fri 26.11.27	Sat 8.01.28	13SS
115	KANAL M4.2	43 d	Sun 30.01.28	Mon 13.03.28	14SS
116	KANAL M4.3	18 d	Mon 13.03.28	Fri 31.03.28	16SS
117	KANAL M5.1	5 d	Fri 18.06.27	Wed 23.06.27	110FS+1 d
118	KANAL M6	39 d	Mon 10.01.28	Fri 18.02.28	18SS
119	KANAL M6.1	12 d	Sat 19.02.28	Thu 2.03.28	19SS
120	KANAL M6.2	20 d	Sat 11.03.28	Fri 31.03.28	20SS
121	KANAL M7	54 d	Wed 30.06.27	Mon 23.08.27	21SS
122	KANAL M7.1	30 d	Fri 10.12.27	Sun 9.01.28	17SS
123	KANAL M8	78 d	Sun 1.08.27	Mon 18.10.27	22SS-23 d
124	KANAL M8.2	5 d	Tue 19.10.27	Sun 24.10.27	123FS+1 d
125	KANAL M9.1	6 d	Mon 22.03.27	Sun 28.03.27	30FS+1 d
126	KANAL M9.3	18 d	Wed 21.04.27	Sun 9.05.27	96FS+1 d
127	**ZAKLJUČNA DELA**	**743 d**	**Mon 20.04.26**	**Tue 2.05.28**	
128	Geodetski posneteki	720 d	Mon 20.04.26	Sun 9.04.28	33SS
129	Priprava dokumentacije za tehnični pregled in tehnični pregled ter predaja objekta	58 d	Sun 5.03.28	Tue 2.05.28	128FS-35 d

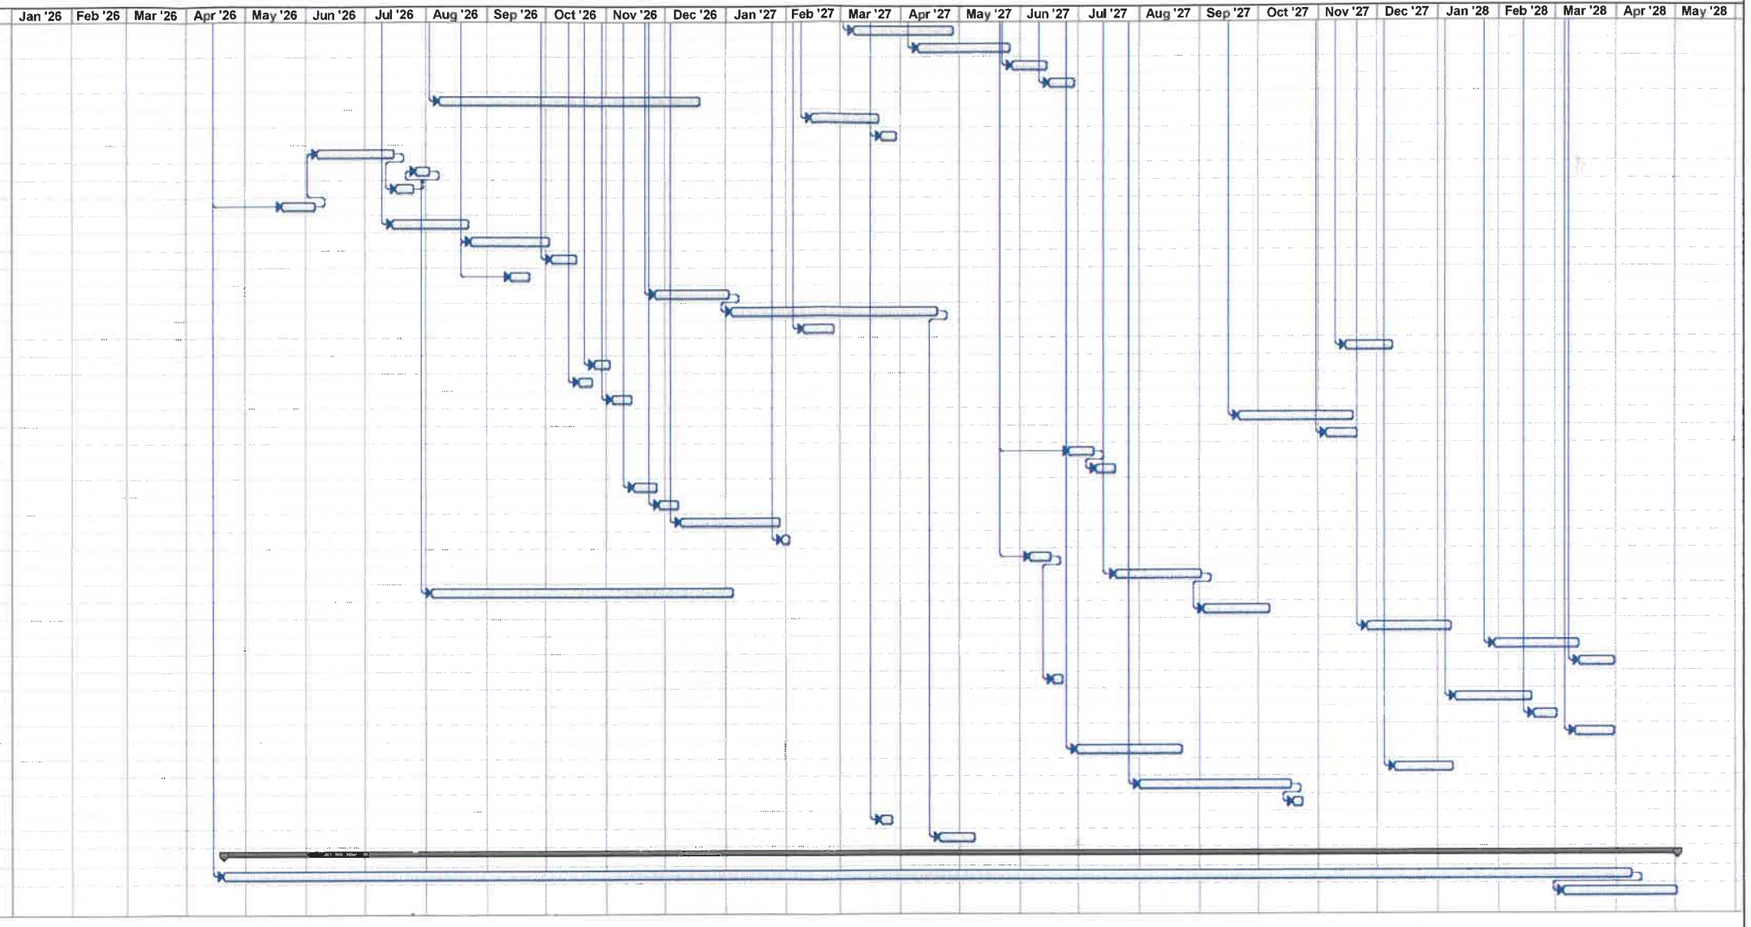

domplan
Domplan, d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 8

Ljubljana, 09.02.2026

PIRC gradnje d.o.o.
LJUBLJANA

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.; RIKO d.o.o.; PIRC gradnje d.o.o. Ljubljana
Vodja del: Alen Slavinec
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.
